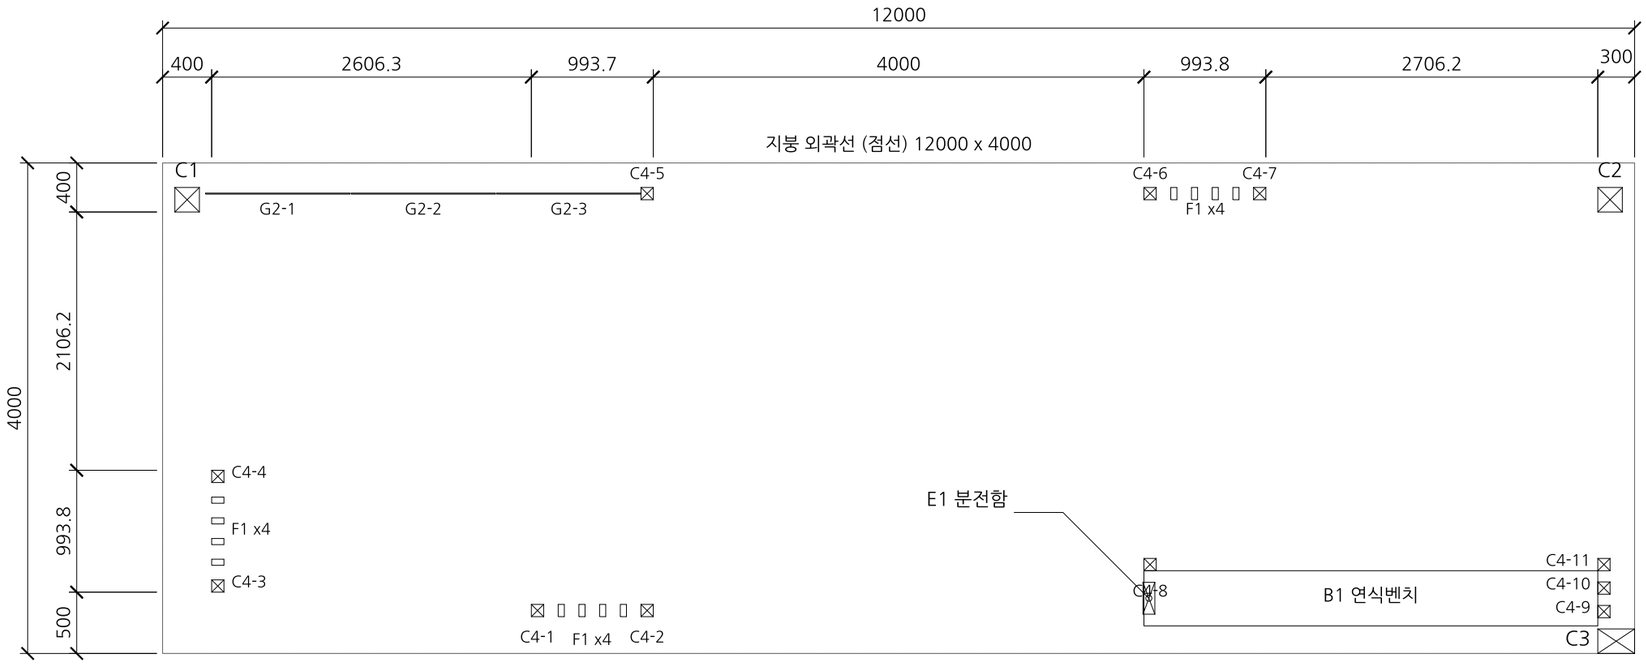



기둥·핀·벽체 배치도 (F.L 상부 수평단면)

S = 1/50

※ 비 고


1. 본 배치도는 원도면 '기초평면도'의 앵커(X표기) 위치를 정면도·측면도와 교차 검증하여 작성함.
2. 좌표 원점: 지붕 좌측·전면 모서리 (X=0, Y=0), 높이 기준 F.L ±0.
3. 원도면 기초평면 표기는 지붕 기준 X +50, Y +150 이동 배치되어 있음 (본 도면은 보정치 적용).
4. 각 부품 상세는 PC-01 ~ PC-12 참조. 부품 일람표는 PC-13 참조.

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	부품 배치도 (KEY PLAN)
부품번호	-
재　질	-
수　량	-
척　도	1/50 (A3)
도면번호	PC-00
원 도 면	L-655 조형파고라C

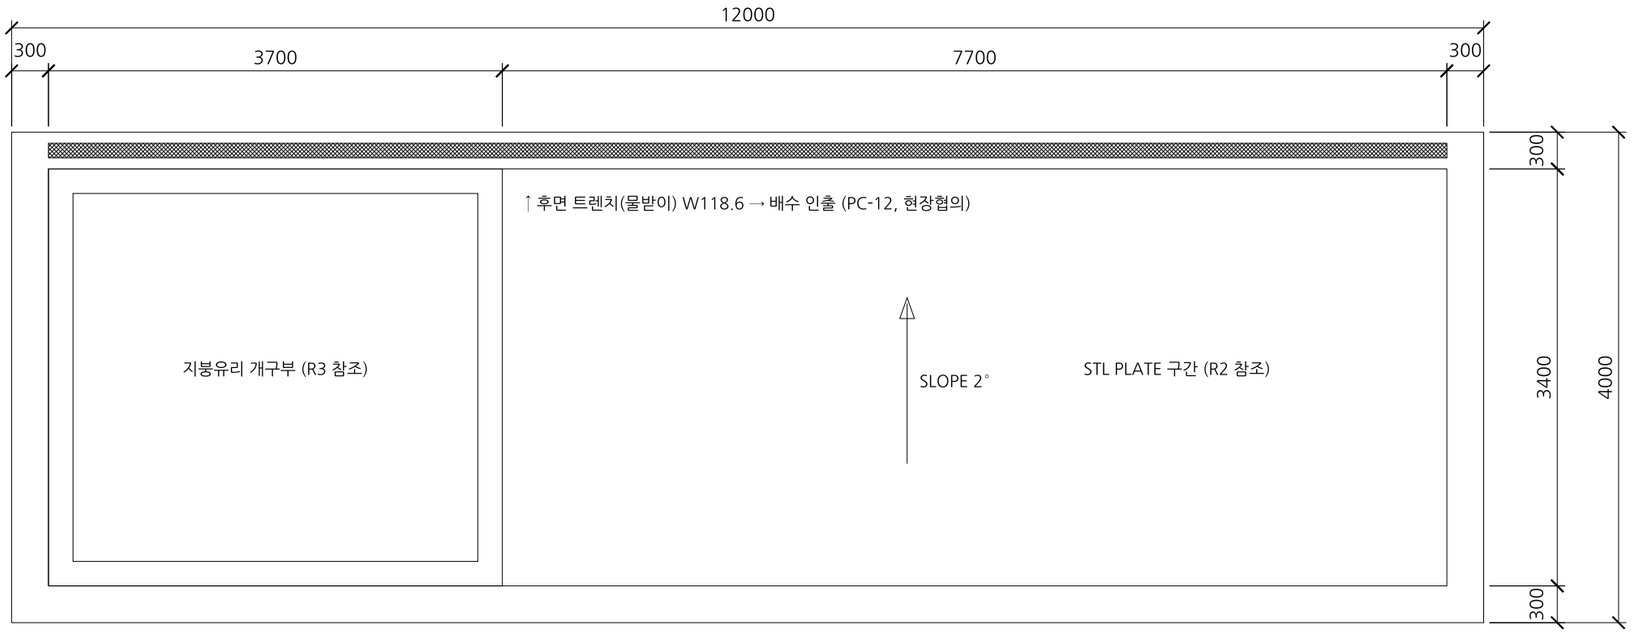


지붕 평면도 (상부)

S = 1/50



정면도

S = 1/50




측면 단면도 (배수구배)

S = 1/25

※ 비 고


1. 외곽 치수 12000 x 4000, 두께 300 (지붕하부 F.L+2700).
2. 외곽 띠(폭 300) : T1.6 STL PLATE 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).
3. 상부 마감면은 후면 방향 2° 구배, 후면 트렌치(W118.6)로 집수.
4. 내부 하지(각관 규격·간격)는 원도면 미표기 → 구조계산 후 확정할 것.
5. 하부: 좌측(X300~4000) 지붕유리 R3, 우측(X4000~11700) 천장판 R2.
6. LED 매입등 8EA 개구부 위치는 PC-02 참조.

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	지붕 프레임 (R1)
부품번호	R1
재　질	STL 각관 하지 + T1.6 STL PLATE 마감 / 지정색 도장
수　량	1 EA
척　도	1/50 (A3)
도면번호	PC-01
원 도 면	L-655 조형파고라C

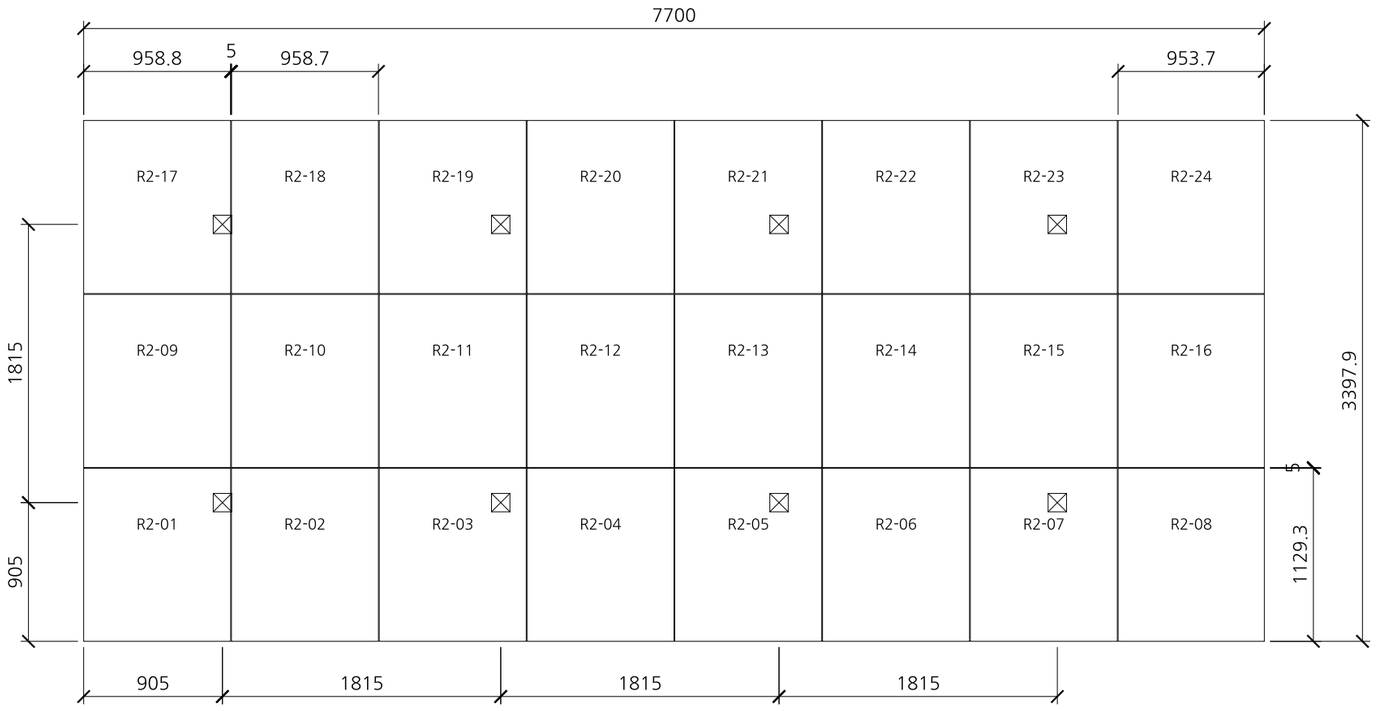

패널 배치도 (지붕 하부에서 올려본 평면)

S = 1/40

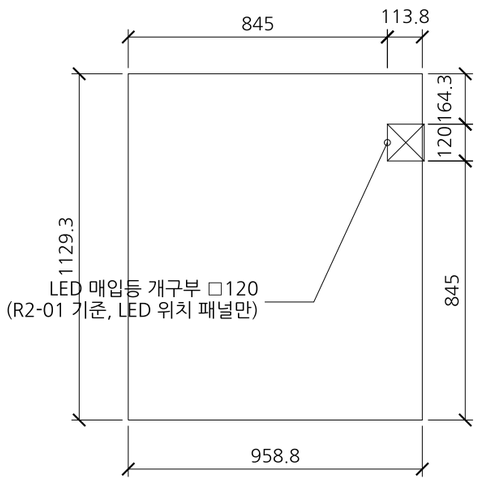

단위 패널 상세 (R2 표준)


S = 1/20

구분	규격(W x L)	수량	비고
R2-A	958.8 x 1129.3	21	표준 (LED 개구부 6EA 포함)
R2-B	953.7 x 1129.3	3	우측 끝열 (X10746.3~11700)
LED	□120 개구	8	4열 x 2행, 피치 1815 / 1815

※ 비 고

1. T1.6 STL PLATE, 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).
2. 패널 줄눈 5mm (X·Y 공통), 지붕 하부 F.L+2700 면에 부착.
3. 우측 끝열 3EA는 폭 953.7 로 현장 맞춤 재단.
4. 4변 절곡(플랜지) 및 고정 방법은 원도면 미표기 → 제작사 표준 적용.
5. LED 매입등 : 총 8EA, 128W (원도면 기준).
6. LED 개구부 위치는 패널마다 상이 → 배치도 좌표로 타공.

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	천장 STL PLATE 패널 (R2)
부품번호	R2
재　질	T1.6 STL PLATE / 지정색 도장
수　량	24 EA
척　도	1/40 (A3)
도면번호	PC-02
원 도 면	L-655 조형파고라C

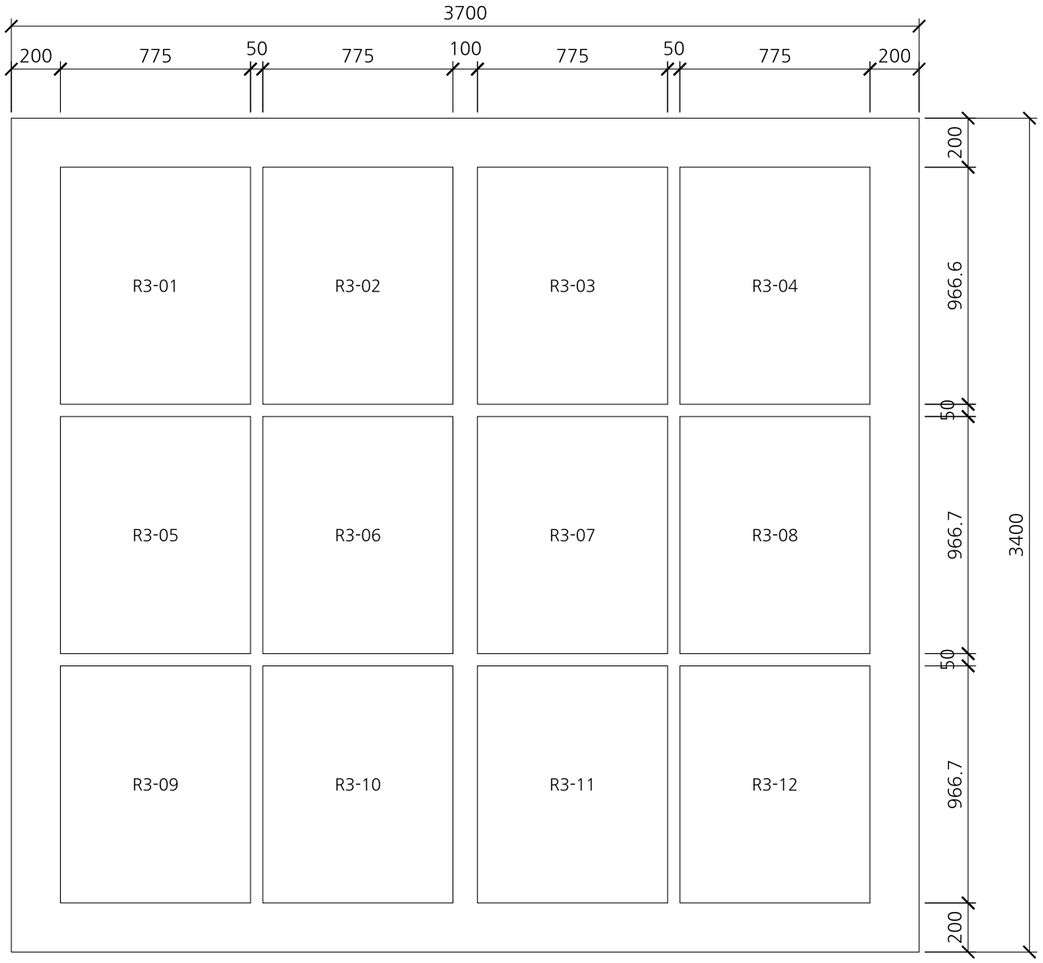


지붕유리 배치도 (평면)

S = 1/25


※ 비 고

1. T10.76 접합유리 (5 + PVB0.76 + 5), 보호필름 부착.
2. 투과율·KS인증 여부: 원도면 미표기 → 발주처 확인.
3. 크기 775 x 966.7, 12EA (4열 x 3행).
4. 줄눈: X방향 50 / 100(중앙) / 50, Y방향 50.
5. 지지 프레임(유리 받침) 상세는 원도면 미표기
   → 실링·세팅블록 포함 제작사 표준 적용.
6. 유리 구성(5+0.76+5)은 T10.76 표준 구성 기준 추정.

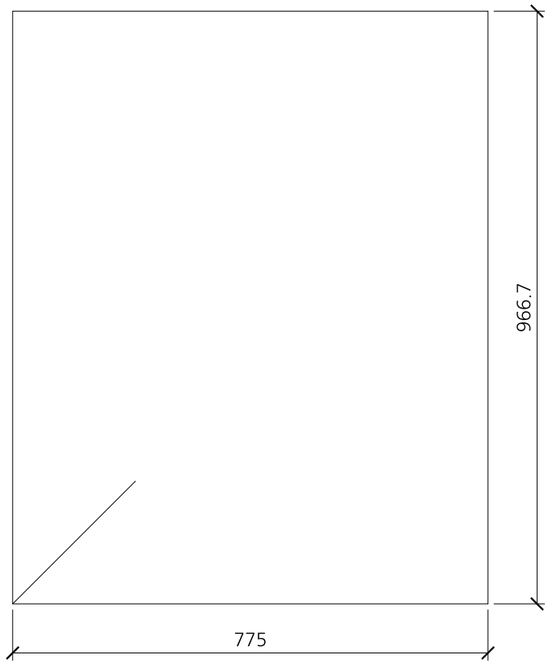

단위 유리 상세


S = 1/10



유리 단면 (T10.76)


S = 1/2

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	지붕 접합유리 (R3)
부품번호	R3
재　질	T10.76 접합유리 (보호필름 부착)
수　량	12 EA
척　도	1/25 (A3)
도면번호	PC-03
원 도 면	L-655 조형파고라C

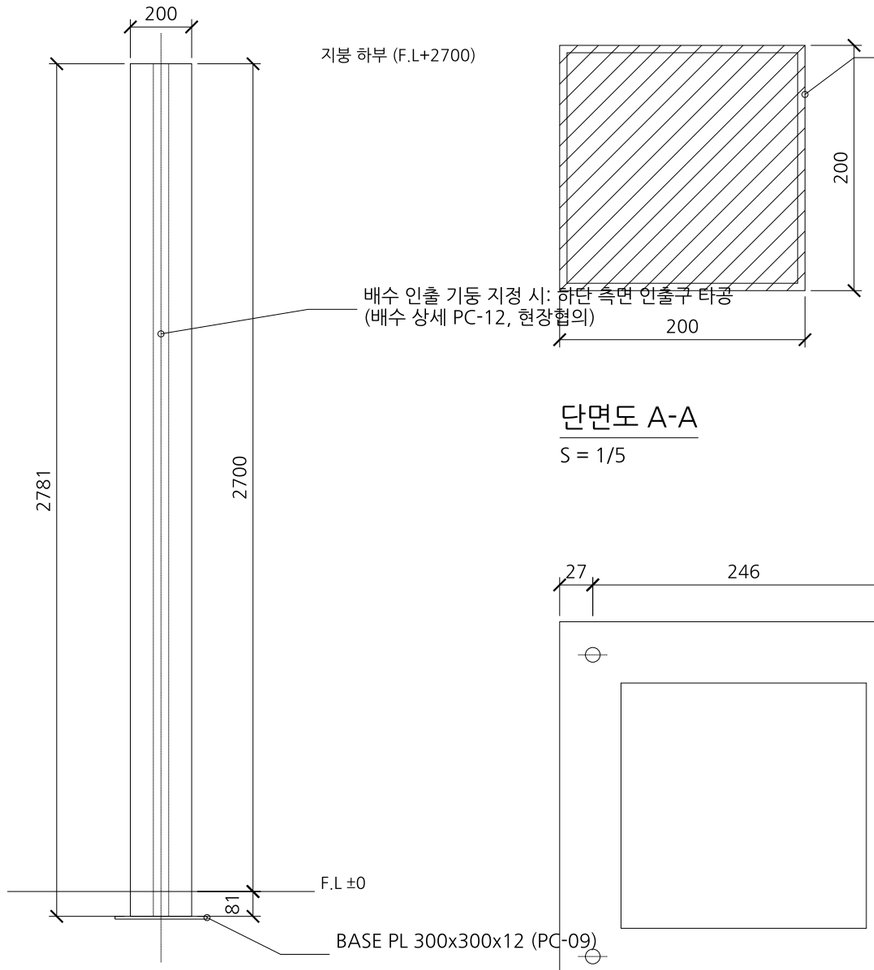

입면도

S = 1/20

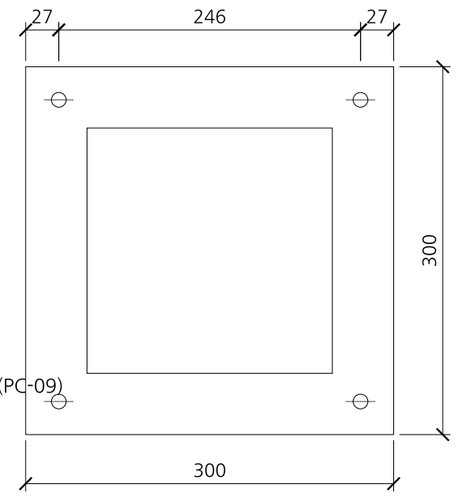

베이스플레이트 평면

S = 1/5

앵커: M10 x L100 셋트앙카 (구멍 Φ12)

단면도 A-A

S = 1/5


설치 위치 (PC-00 좌표, 단위 mm)

부호	X(좌하단)	Y(좌하단)	단면
C1	100	3600	200x200
C2	11700	3600	200x200

※ 비 고


1. 재질: STL 각관 □200x200 (SS275).
2. 길이 L = 2781 (F.L 상부 2700 + 포장 하부 81).
3. 하단 BASE PLATE 전둘레 용접 후 M10xL100 셋트앙카 고정 (PC-09).
4. 상단은 지붕 하지(R1)에 용접 또는 브라켓 볼트 고정.
5. 수량 2 EA, 표면처리: 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).
6. 배수 인출 기둥 위치 현장협의 (PC-12)

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	□200x200 기둥 (C1/C2)
부품번호	C1/C2
재　질	STL 각관 □200x200 (SS275)
수　량	2 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-04
원 도 면	L-655 조형파고라C

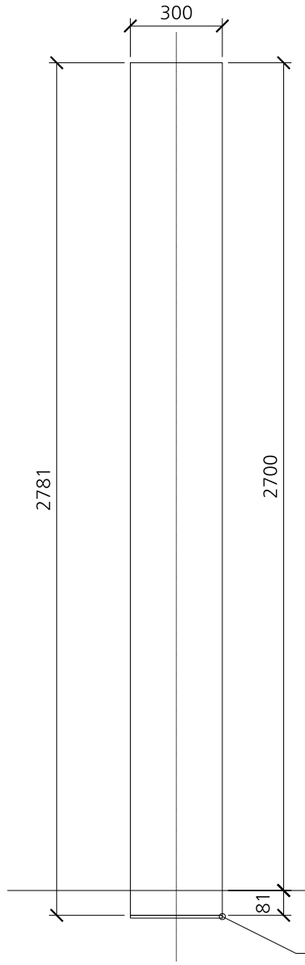


입면도

S = 1/20

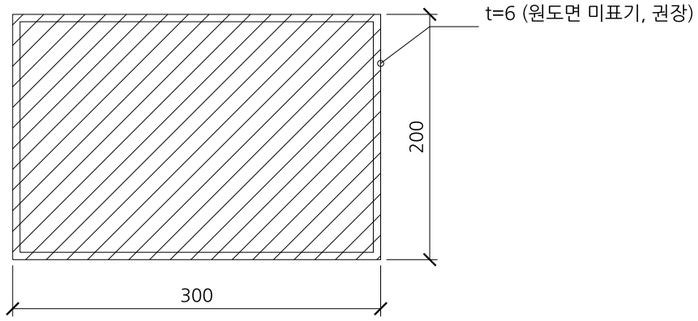

단면도 A-A

S = 1/5

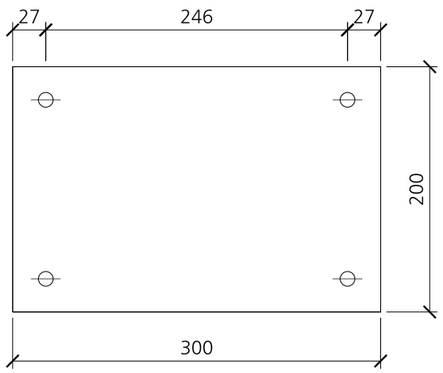

베이스플레이트 평면

S = 1/5

앵커: M10 x L100 셋트앙카 (구멍 Φ12)


설치 위치 (PC-00 좌표, 단위 mm)

부호	X(좌하단)	Y(좌하단)	단면
C3	11700	0	300x200

※ 비 고


1. 재질: STL 각관 □300x200 (SS275).
2. 길이 L = 2781 (F.L 상부 2700 + 포장 하부 81).
3. 하단 BASE PLATE 전둘레 용접 후 M10xL100 셋트앙카 고정 (PC-09).
4. 상단은 지붕 하지(R1)에 용접 또는 브라켓 볼트 고정.
5. 수량 1 EA, 표면처리: 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).
6. 원도면 기초평면 4모서리 앵커 표기 기준

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	□300x200 기둥 (C3)
부품번호	C3
재　질	STL 각관 □300x200 (SS275)
수　량	1 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-05
원 도 면	L-655 조형파고라C

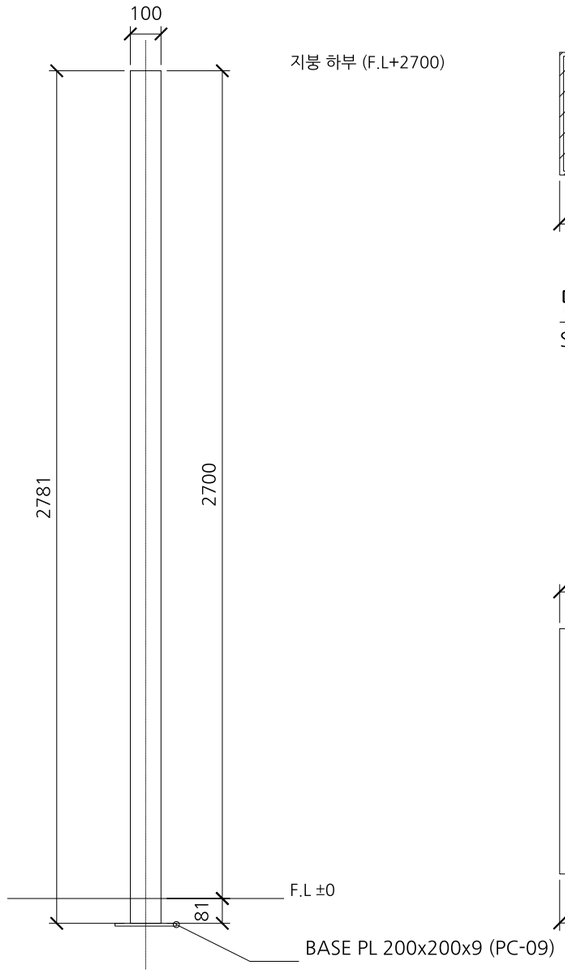


입면도

S = 1/20



단면도 A-A

S = 1/5

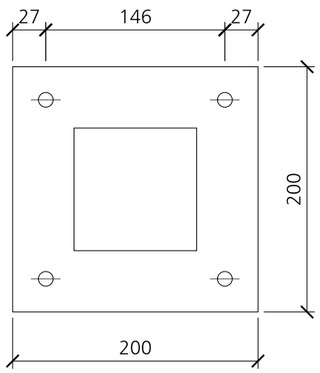

베이스플레이트 평면

S = 1/5

앵커: M10 x L100 셋트앙카 (구멍 Φ12)


설치 위치 (PC-00 좌표, 단위 mm)

부호	X(좌하단)	Y(좌하단)	단면
C4-1	3006.3	300	100x100
C4-2	3900	300	100x100
C4-3	400	500	100x100
C4-4	400	1393.8	100x100
C4-5	3900	3700	100x100
C4-6	8000	3700	100x100
C4-7	8893.8	3700	100x100
C4-8	8000	675	100x100
C4-9	11700	291.7	100x100
C4-10	11700	483.3	100x100
C4-11	11700	675	100x100

※ 비 고


1. 재질: 100x100 STL PIPE (각관) 지정색 도장.
2. 길이 L = 2781 (F.L 상부 2700 + 포장 하부 81).
3. 하단 BASE PLATE 전둘레 용접 후 M10xL100 셋트앙카 고정 (PC-09).
4. 상단은 지붕 하지(R1)에 용접 또는 브라켓 볼트 고정.
5. 수량 11 EA, 표면처리: 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	□100x100 기둥 (C4)
부품번호	C4
재　질	100x100 STL PIPE (각관) 지정색 도장
수　량	11 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-06
원 도 면	L-655 조형파고라C

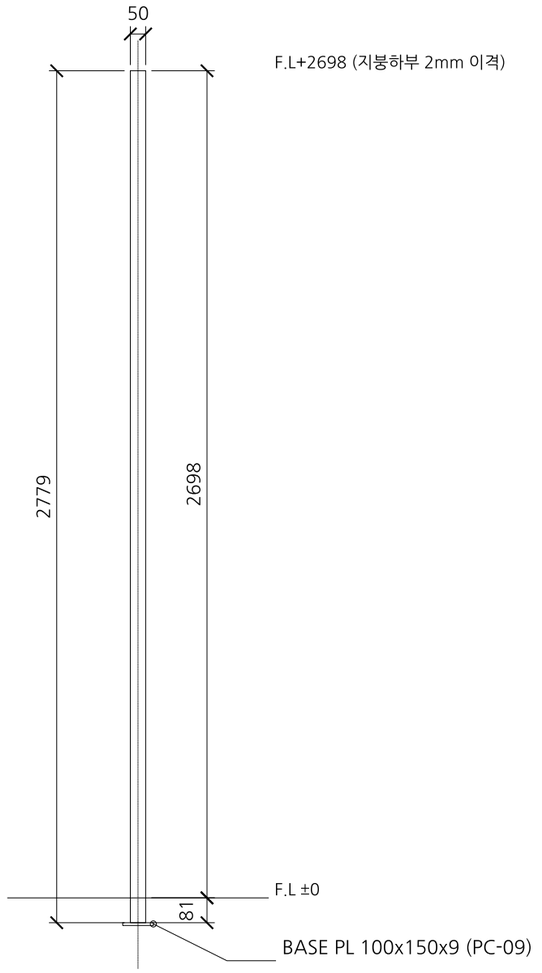


입면도

S = 1/20



단면도 A-A

S = 1/5



베이스플레이트 평면

S = 1/5

앵커: M10 x L100 셋트앙카 (구멍 Φ12)


설치 위치 (PC-00 좌표, 단위 mm)

부호	X(좌하단)	Y(좌하단)	단면
F1-1	3225	300	50x100
F1-2	3393.8	300	50x100
F1-3	3562.5	300	50x100
F1-4	3731.3	300	50x100
F1-5	400	718.8	50x100
F1-6	400	887.5	50x100
F1-7	400	1056.3	50x100
F1-8	400	1225	50x100
F1-9	8218.8	3700	50x100
F1-10	8387.5	3700	50x100
F1-11	8556.3	3700	50x100
F1-12	8725	3700	50x100

※ 비 고


1. 재질: 50x100 STL 각관 지정색 도장.
2. 길이 L = 2779 (F.L 상부 2698 + 포장 하부 81).
3. 하단 BASE PLATE 전둘레 용접 후 M10xL100 셋트앙카 고정 (PC-09).
4. 상단은 지붕 하지(R1)에 용접 또는 브라켓 볼트 고정.
5. 수량 12 EA, 표면처리: 지정색 도장 (색상 원도면 미표기).
6. 핀 피치 168.75 C/C, 지붕하부 2mm 이격

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	50x100 루버 핀 (F1)
부품번호	F1
재　질	50x100 STL 각관 지정색 도장
수　량	12 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-07
원 도 면	L-655 조형파고라C

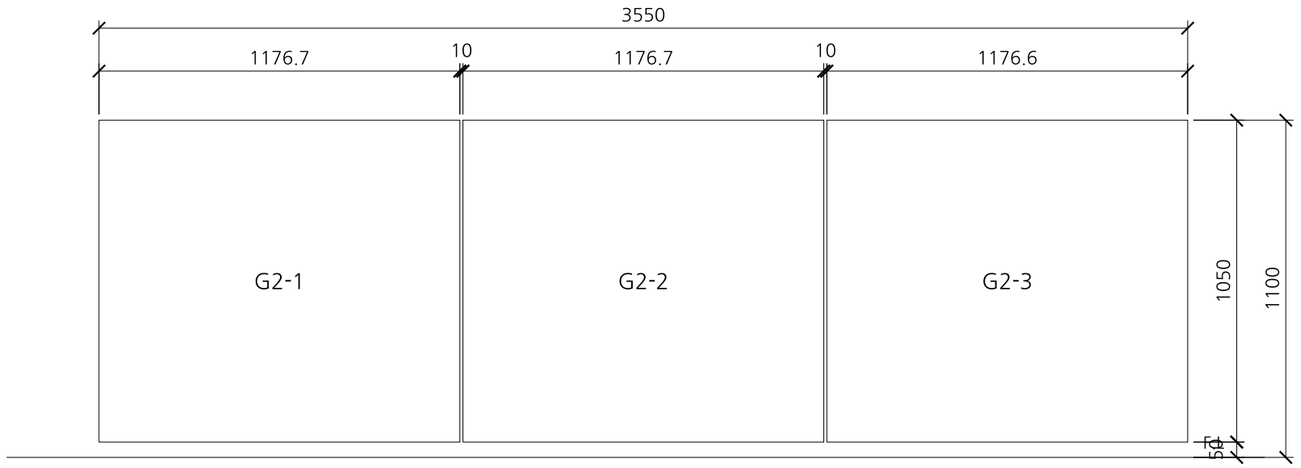

입면도 (후면 좌측 X350~3900)

S = 1/20

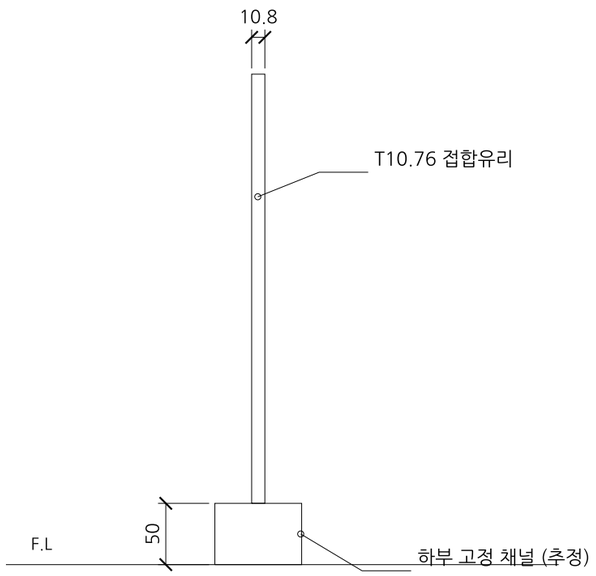


설치 단면 (Y방향)

S = 1/5

※ 비 고


1. T10.76 접합유리, 보호필름 부착 (투과율 원도면 미표기).
2. 크기 1176.7(W) x 1050(H) x 3EA, 유리간 줄눈 10.
3. 설치높이 F.L+50 ~ +1100 (정면도 기준).
4. 설치 위치: 후면 Y3700~3800 라인 (C1 기둥 ~ C4-5 기둥 사이).
5. 고정 방식(채널/클램프)은 원도면 미표기 → 제작사 표준 적용.

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	벽체 접합유리 (G2)
부품번호	G2
재　질	T10.76 접합유리 (보호필름 부착)
수　량	3 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-08
원 도 면	L-655 조형파고라C

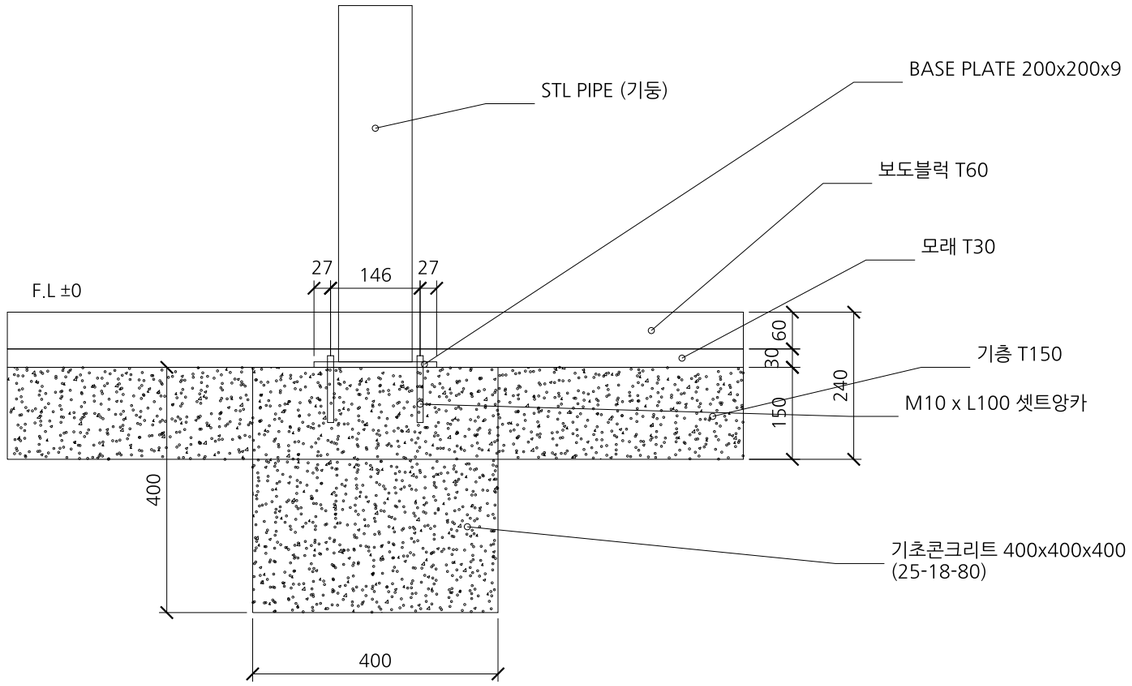

기초 단면 상세

S = 1/10

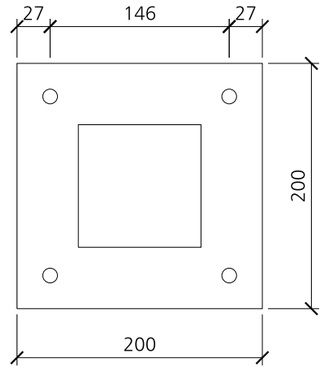

BASE PLATE 평면 (C4 / □100 기준)


S = 1/5

적용 부재	BASE PL	앵커	수량
C1/C2 □200	300x300x12	M10 4EA	2
C3 □300x200	300x200x12	M10 4EA	1
C4 □100	200x200x9	M10 4EA	11
F1 50x100	100x150x9	M10 2EA	12

※ 비 고


1. 원도면 상세: BASE PL 200(W) x 9(t) 실측, 앵커 C/C 146, M10xL100 셋트앙카, 기초 400x400x400 (25-18-80).
2. 상기 표 중 □200/□300/핀 BASE PL 규격은 원도면 미표기 → 기둥 단면에 맞춘 제안치 (구조검토 필요).
3. BASE PL 상면 F.L-81, 기초 상단 F.L-90 (L-655 기초상세도). 포장: 보도블럭 60 / 모래 30 / 기층 150 (계 240).
4. 기초 총 26개소 (기둥 14 + 핀 12).

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	기초 및 BASE PLATE 상세 (FD)
부품번호	FD
재　질	콘크리트 25-18-80 / SS275
수　량	26 EA
척　도	1/10 (A3)
도면번호	PC-09
원 도 면	L-655 조형파고라C

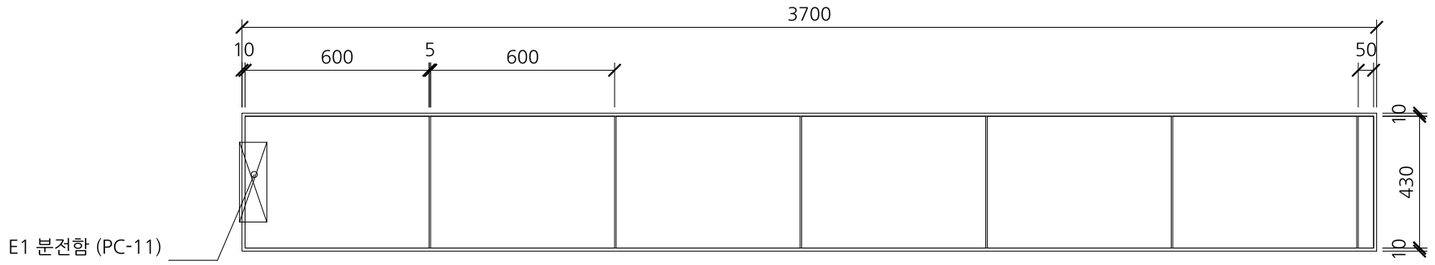


평면도

S = 1/20

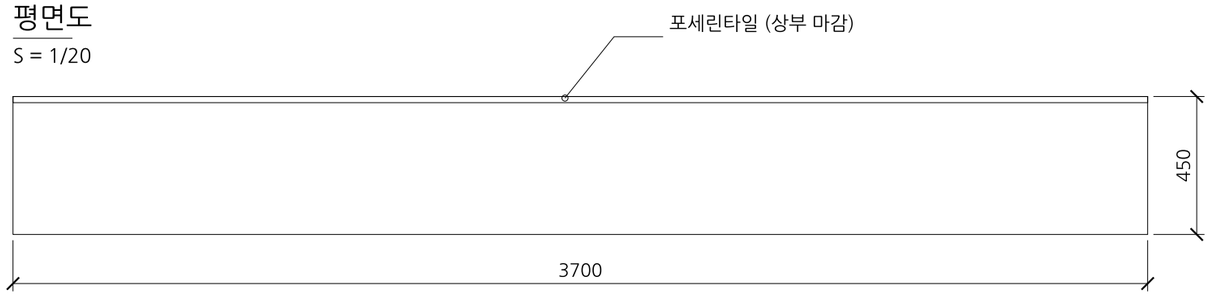

정면도

S = 1/20

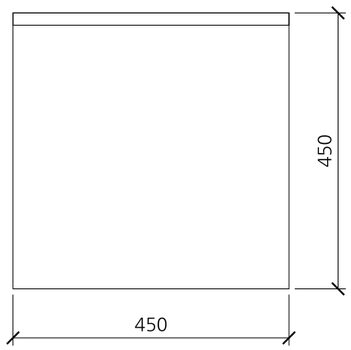


측면도

S = 1/10

※ 비 고

1. 설치 위치: X8000~11700, Y225~675 (PC-00).
2. 상판 포세린타일 600 x 430, 줄눈 5, 6EA + 끝단 50 x 430 1EA.
3. 테두리 프레임 폭 10 (평면 기준).
4. 좌측 측면에 분전함(E1) 설치, 하부 배선 F-CV 2.5SQ 이상.
5. 내부 하지 및 타일 접착 방식은 원도면 미표기 → 제작사 표준.
6. 타일 두께는 원도면 미표기 (단면 20 가정).

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	연식벤치 (B1)
부품번호	B1
재　질	STL 프레임 + (상부) 포세린타일
수　량	1 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-10
원 도 면	L-655 조형파고라C

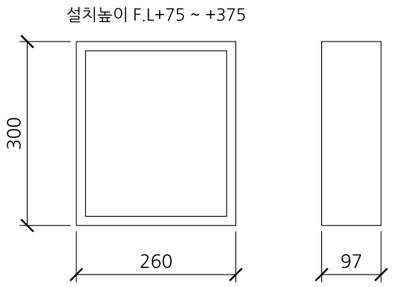

분전함 E1 (정면 / 측면)

S = 1/10


※ 분전함 사양
· 0.5kW 이상 (220V, 단상)
· 제품 내 모든 전선 2.5SQ 이상 F-CV선
· 누전차단기, 접지 부스바, 타이머 적용
· 전기인입 구분: 평면 '1차 전기공사분' / 정면 '조경공사분' (확인)
· 크기는 원도면 축척 실측치 (기성품 선정 시 조정)

※ LED 매입등 L1
· 등기구류: 128W (8EA, 실사용전력은 기구에 따라 다름)
· 총 전기용량: 128 x 1.3(여유율) = 0.5kW
· 배치: X 4905/6720/8535/10350, Y 1205/3020

※ 비 고
1. 배수 상세는 PC-12 참조 (원도면 L-655 '배수 상세도').

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	분전함·조명 (E1/L1)
부품번호	E1
재　질	기성품
수　량	1 EA
척　도	1/20 (A3)
도면번호	PC-11
원 도 면	L-655 조형파고라C

※ 비 고
1. 원도면 L-655 '배수 상세도'를 축척 실측하여 작성.
2. 지붕 트렌치 → 배수 기둥 내부 → 하부 측면 인출관 → 배수관 Φ100 → 조경 빗물받이(500x600).
3. 공사 구분: 기둥·인출관 = 시설물 공사분, 배수관·빗물받이 = 우배수 공사분.
4. ※ 배수 관련 현장협의 후 진행 (원도면 명기).
5. 배수 인출 기둥 위치는 원도면 미표기 (L-654 에서는 C2 우측 후면 기둥 내장).
6. 본 상세의 포장은 슬래브형(상부 100 / 콘크리트 100+메쉬 / 기층 150)으로 PC-09 기초상세와 상이 → 배수 기둥 위치의 포장구성 현장 확인.
7. BASE PL 은 인출구 측으로 비대칭 연장(실측 292), 앵커 C/C 159, 관경(Φ32/Φ100)은 실측치 → 규격 확인.

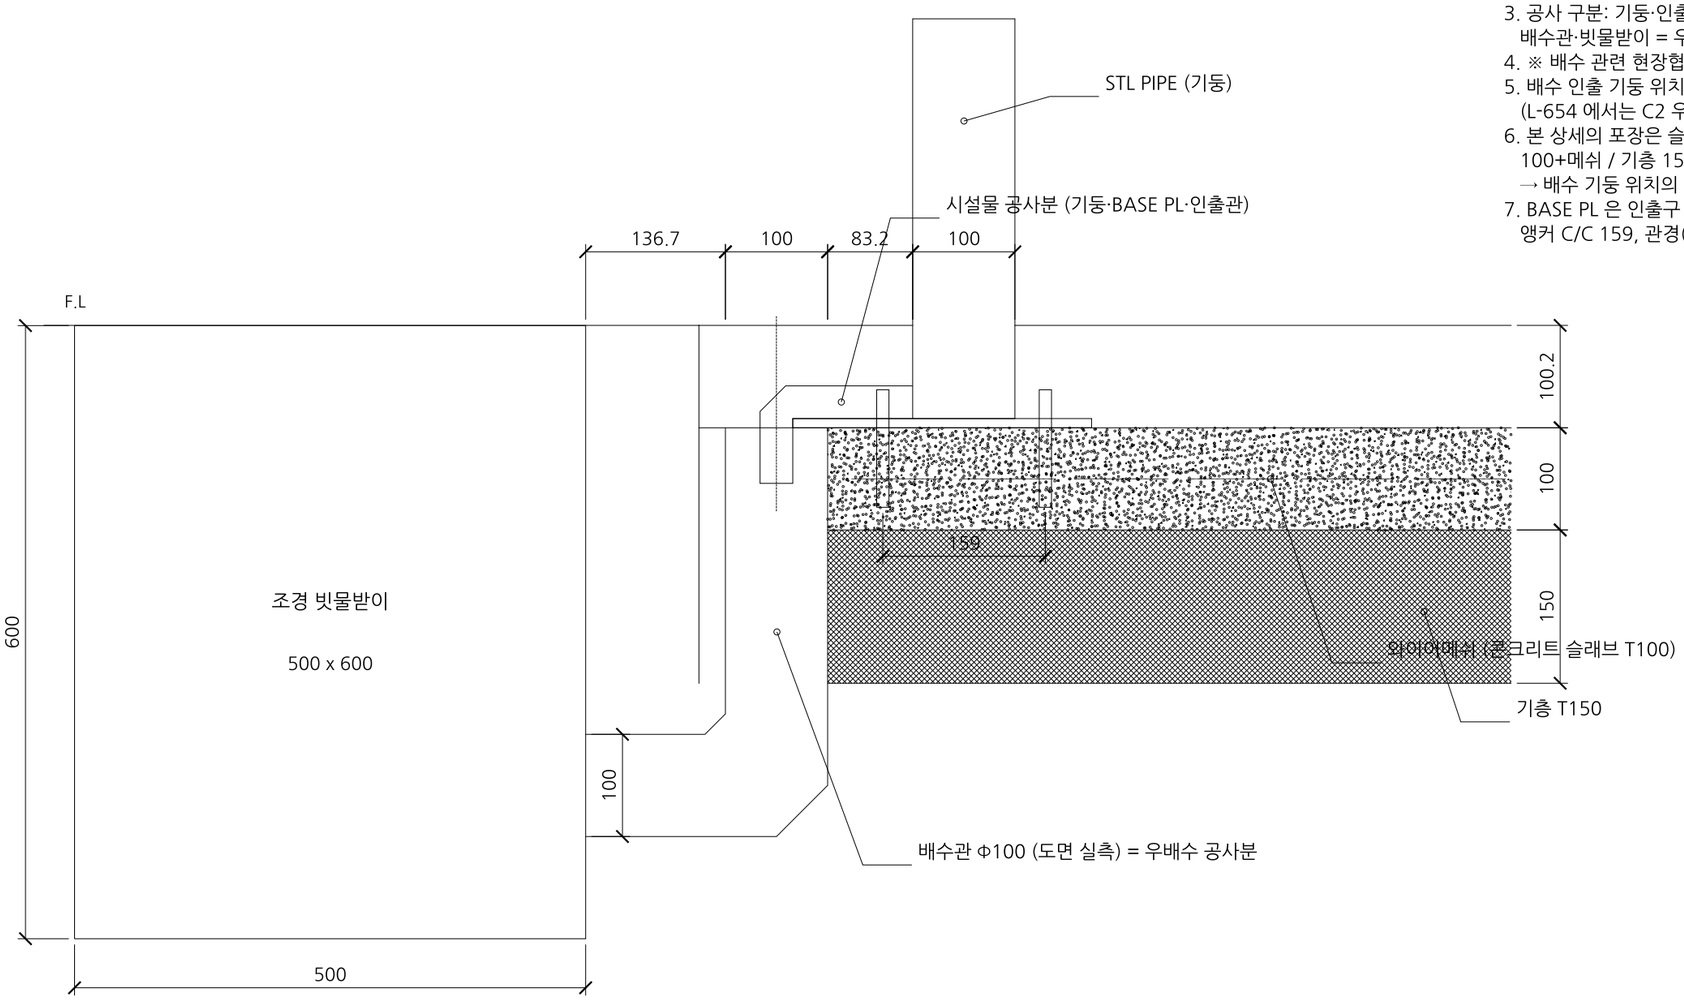

배수 상세도 (원도면 L-655 기준)

S = 1/6

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	배수 상세 (D0/D1/D2)
부품번호	D0
재 질	STL (기둥 일체, 시설물 공사분)
수 량	1 EA
척 도	1/10 (A3)
도면번호	PC-12
원 도 면	L-655 조형파고라C

부호	품명	규격	재질	수량	단위길이	비고
R1	지붕 프레임(외곽 박스)	12000 x 4000 x H300	STL 각관 하지 + T1.6 STL PLATE 마감 / 지정색 도장	1	-	내부 하지 구조 원도면 미표기
R2	천장 STL PLATE 패널	958.8 x 1129.3 (21EA) / 953.7 x 1129.3 (3EA)	T1.6 STL PLATE / 지정색 도장	24	-	줄눈 5mm, LED 개구부 포함 8EA
R3	지붕 접합유리	775 x 966.7	T10.76 접합유리 (보호필름 부착)	12	-	유리 줄눈 50/100
C1/C2	□200x200 기둥	□200x200 L=2781	STL 각관 □200x200 (SS275)	2	2781.0	배수 인출 기둥 위치 현장협의 (PC-12)
C3	□300x200 기둥	□300x200 L=2781	STL 각관 □300x200 (SS275)	1	2781.0	원도면 기초평면 4모서리 앵커 표기 기준
C4	□100x100 기둥	□100x100 L=2781	100x100 STL PIPE (각관) 지정색 도장	11	2781.0	
F1	50x100 루버 핀	□50x100 L=2779	50x100 STL 각관 지정색 도장	12	2779.0	핀 피치 168.75 C/C, 지붕하부 2mm 이격
G2	벽체 접합유리	1176.7 x 1050	T10.76 접합유리 (보호필름 부착)	3	-	후면 좌측 벽
FD	기둥 기초 + BASE PLATE	기초 400x400x400 / BASE PL 200x200x9	콘크리트 25-18-80 / SS275	26	-	기둥·핀 1개소당 1EA
B1	연식벤치	3700 x 450 x H450	STL 프레임 + (상부) 포세린타일	1	3700	타일 600x430 x6 + 50x430 x1
E1	분전함	260 x 300 x 97 (도면 실측)	기성품	1	-	0.5kW 이상, 220V 단상
L1	LED 매입등	□120, 16W급 x 8EA = 128W	기성품	8	-	지붕 하부 R2 패널 개구부
D0	배수 인출구 (기둥 하부)	인출관 약 Φ32 (도면 실측)	STL (기둥 일체, 시설물 공사분)	1	-	배수 인출 기둥 1개소, 위치 현장협의
D1	배수관	Φ100 (도면 실측)	현장협의	1	-	우배수 공사분, 인출구 → 빗물받이
D2	조경 빗물받이	500 x 600	기성품	1	-	우배수 공사분, 현장협의

※ 비 고

1. 원도면에 명시된 값: 외곽 치수, 기둥·핀 위치, 유리 규격(T10.76), 강판(T1.6), 기초(400x400x400), 앵커(M10xL100), 도장(지정색).
2. 원도면 미표기 → 제안치/추정치(각 도면에 '미표기' 표시): 각관 두께, □200·□300·핀용 BASE PL, 지붕 내부 하지, 유리 지지 프레임.
3. 제작 전 구조계산 및 감리 승인 후 확정할 것.

공 사 명	조형파고라C(회랑형) 제작
도 면 명	부품 일람표 (BOM)
부품번호	-
재　질	-
수　량	-
척　도	1/1 (A3)
도면번호	PC-13
원 도 면	L-655 조형파고라C
